INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE

IKTK

MIRATOHET

Sekretari I KKR
ARTA DOLLANI

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: PROJEKT RESTAURIMI, NYMFEU DHE TERMET E STACIONIT AD QUINTUM, BRADASHESH, ELBASAN

Nr.	Nr. Analitik	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Orë pune / njësi	Orë pune, total	Disë Pune Total	Punëtorë	Disë pune për punëtorë	Llojë i Punëmit
1	R.1/1	Heqje dherash dhe depozitimesh në kreun e mureve dhe terren si dhe transport me karro dore	m^2	50	4	200	25	2	13	A. PUNIME DHEU
2	R.1/1	Pastrim i dyshemeve tek Termat dhe Hauzet nga dherat e hedhur dhe depozitimet e papërshtatshme dhe transport me karro dore	m^3	20	4	80	10	2	5	
3	R.5	Pastrim nga bimësia e ulët në kreun e mureve dhe territor përreth	m^2	400	1.5	600	75	3	25	
4	R.5/1	Pastrim nga bimësia e ulët +injektim +solucionit për tharjen e bimëve të lëkuja në murature	m^2	140	2	280	35	2	18	
5	R.5/2	Prerje dhe tharje të rrënjëve masive(rrundap 200cc)	copë	4	2	8	1	1	1	
6	2.37/5b	Transport material ndërtimi, mbeturina, dheu me auto deri 10.0km	m^3	70	1	70	8.75	2	4	
1	R.10/1	Fasetim i kreut të murit	m^2	240	0.7	168	21	2	11	B.PUNIME MURATURE
2	R.16/1	Pastrim i gurëve dhe kopetave nga mbetjet dhe llaçi i degradimit	m^2	25	2.4	60	8.25	2	4	
3	R.132/1	Pastrimi i mureve të Termave në faqeshë nga pluhurat dhe depozitimet sipërfaqësore me furçë dhe larje me ujë të distiluar	m^2	50	1	50	6.25	1	6	
4	R.132/2	Pastrim mekanik i mureve të Termave në faqeshë nga pluhurat dhe depozitimet sipërfaqësore me furçë të butë	m^2	120	0.5	60	7.5	1	8	
5	R.20/1	Konsolidim (fugatim) i kreut të murature me llaç hidraulik	m^2	184	1	184	23	2	12	
6	R.136	Punime puthitëse gëmuar (hauzet L1 dhe kapela PM)	m^2	19.5	3.25	63.38	7.92	2	4	
7	R.137	Çmontim puthitës gëmuar dhe kopetë pa vlerë	m^2	19.5	2.34	45.63	5.70	2	3	
8	R.139	Ngritje mure dhe qepe e parave në qemer (emisferi) (Hauz 1-2 dhe 3) dhe kopetë fëmijësh vaska e larë (PM) dhe murature me lëvizëse e qumshtit (Pastrim i qepës, larje me ujë, injektim llaç gëlqere 1:3)	m	16	10	160	20	2	15	
9	R.166	Fugatim në kopetë (PM) - llaç gëlqere hidraulikisht me shtesë kashtë dhe tullë pluhur	m^2	14	5	70	8.75	2	4	
10	R.25	Fugatim me gëlqere (Hauz 1, 2, 3)(pastrim me furçë + larje me ujë+fugatim)	m^2	12	2.5	30	3.75	1	4	
11	R.25	Fugatim me murature me llaç hidraulik	m^2	80	2.5	200	12.5	1	13	
12	R.165	Hidroizolim i kopetës me llaç hidraulik	m^2	1.5	0.6	0.9	1.64	1	2	
13	R.160/1	Njësi e fiksë në mur për vendosjen e strukturës së gëmuarë (hauzet 1)	copë	4	2	8	1	1	1	
14	R.160/1	Njësi e fiksë në mur për vendosjen e strukturës së gëmuarë (hauzet 1)	copë	10	2	20	2.5	1	3	
15	R.171	[illegible]	m2	24	2.5	60	8.75	2	4	
16	R.230	[illegible]	kg	30	0.15	4.5	0.56	1	1	
17	R.172	[illegible]	m2	15	2.5	37.5	4.69	2	2	
18	R.18	Restaurim mure gëlqere me llaç gëlqere 1:3 me kërcitës shqipe-qeq	m^3	7	25	42	5.25	1	5	
19	R.222	Konsolidim i mbulimit	m^2	14	3	42	5.25	1	5	
20	Ao. 1	Kapakim i muri me Fugat llaç dhe shtresë konsoli	m^2	184	1	184	23	2	12	
21	R.121	Prerje [illegible] (hauz 1-2 dhe 3)	m^2	6	1.25	7.5	0.94	1	1	
22	R.89	[illegible]	m^2	56	4	224	28	2	14	
23	R.73	[illegible]	m^3	10.6	1.02	10.81	1.35	1	1	
24	R.60/1	[illegible]	m^2	15	4	60	7.5	2	3	
1	R.5	[illegible]	m^2	50	6	300	37.5	2	19	C.DRENAZHI
2	Ao.R.14/1	Kanalet me mozaik gëlqe	m^2	40	4	160	40	2	20	
3	8.12/b	Nën-shtresë [illegible] 20cm	m^3	40	0.075	3	0.38	1	1	
4	R.139	Nën-shtresë gëlqeje 20cm	m^3	20.4	0.05	1.0	0.1	1	1	
5	Ao-6 (Ao.5/a.2)	Shtresë gëlqeje [illegible]	m^2	120.2	0.05	10.1	1.26	1	1	
1	R.78/1	Çmontim [illegible] druesë	m^3	168	1.5	252	25.2	4	6	D.RESTAURIM ÇATIE
2	Ao.2	[illegible] çati HO*8m, me njësëlëvizëse	m^3	223	5	1115	111.5	4	24	
3	R.82	Fugatim me [illegible] kolona dru poshtë [illegible]	m^3	2.4	30.4	72.96	9.12	2	5	
4	[illegible]	[illegible] metalike për fiksim [illegible]	kg	120	[illegible]	576	72	3	24	
5	[illegible]	[illegible]	m^3	[illegible]	[illegible]	3.416	0.427	1	1	
6	R.41	[illegible]	t	16	1.1	17.6	2.2	1	7	
7	R.42	Ullë shtesë [illegible]	m3	76	1.3	33.8	4.225	1	4	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E. TË TJERA
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

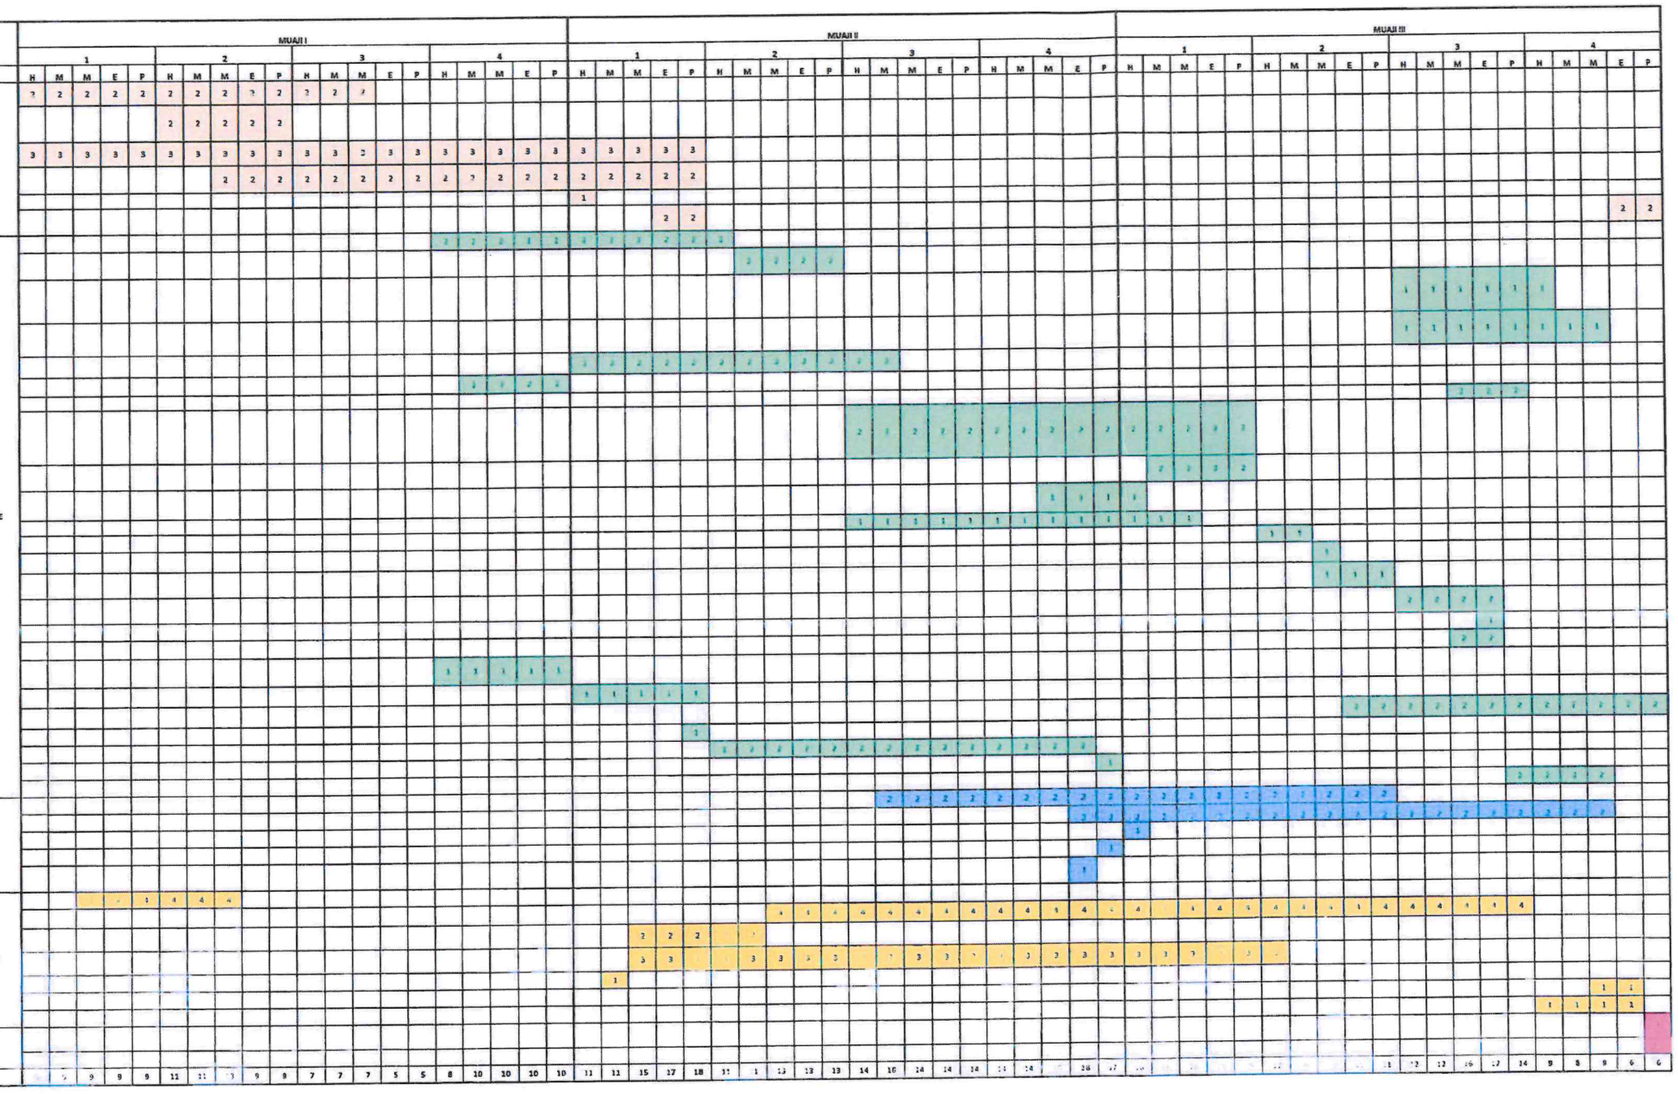

Kohëzgjatja e realizimit të punimeve: 3 muaj
[illegible] max 18

Përgatiti: [illegible]

Ark. Ronela Çuku

Ronela cuku

Digitally signed by Ronela cuku
Date: 2021.06.15 03:07:03 +02'00'

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI KOMBËTAR I TRASHËGIMISË KULTURORE
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
